

KGM/16.142/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/16.142/K

Tanımı Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (Her Ebat ve Kalınlıkta)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	294,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	332,71	0,00	0,00
2014	329,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	377,71	0,00	0,00
2017	435,33	0,00	0,00
2021	845,78	0,00	0,00
2018	499,14	0,00	0,00
2020	708,29	0,00	0,00
2019	612,01	0,00	0,00
2022-1	1425,94	0,00	0,00
2022-2	1840,14	0,00	0,00
2023-1	2645,94	0,00	0,00
2023-2	3857,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

KGM/16.142/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

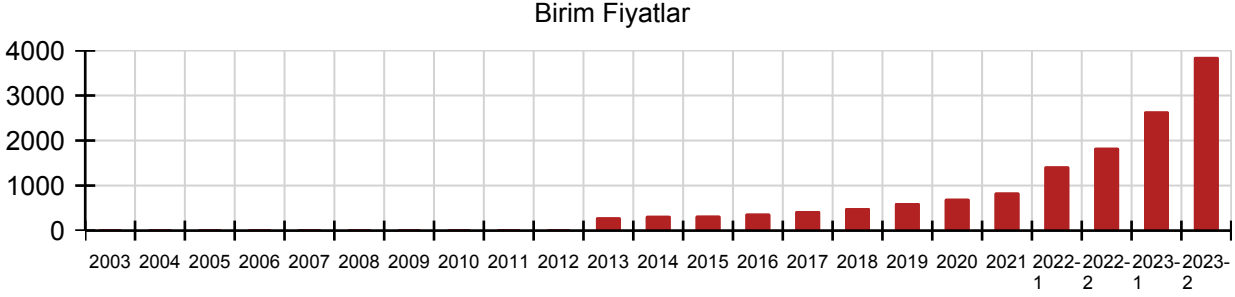

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her ebat ve kalınlıkta prekast cephe panelleri yapılması ve yerlerine konulması (Beton santrali ve kırmataş ile).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Prekast cephe panellerinin imalinde; gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, plastik şekil verici malzemelerin temini ve kalıp içerisine yerleştirilmesi, kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, gerektiğinde yıkanması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, tartılarak beton santraline verilmesi, gerekli suyun temini, yapılacak laboratuvar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına göre çimento, su, katkı maddesi ve agrega ile birlikte beton tesisinde karıştırılarak beton imali, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, kuru, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb. nin sökülmesi, beton santrali, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin temini, nakli ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve yerlerine konulması, montaj için gerekli olan kaynak ve/veya her türlü malzeme ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren demir ve çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve demir işçiliği, taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline taşınması, kullanılması halinde katkı maddesinin temini, prekast cephe panellerinin imal yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.142/K'daki "Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (Her ebat ve kalınlıkta)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/16.142/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/21.035/K-5		Prekast Elemanlar için 1 m ² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)	m ²	11,000000
KGM/1924		1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,240000
		Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, temizlenmesi, yağlanması ve kaldırılması karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Bölüm Toplamı		
		Plastik Şekil Levhaları, Kalıp için Özel Platform Yapılması Karşılığı : (BT*0,1)		
KGM/16.023/K-1		Her Dozda Demirli Beton (Beton Santrali iile) (Kırmataş ile)	m ³	1,000000
		Prekast cephe panellerinin yerlerine konulması karşılığı:		
KGM/16.140/K		Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması	m ³	1,000000
KGM/16.140/K		Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması	m ³	0,050000
