

43.560.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1503 (12.220803)

Tanımı Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	671,53	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	658,58	0,00	0,00
2022-1	1222,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2504,61	0,00	0,00
2023-2	3732,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	1663,95	0,00	0,00
2022-3	1707,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	634,61	0,00	0,00
2019	629,58	0,00	0,00

43.560.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

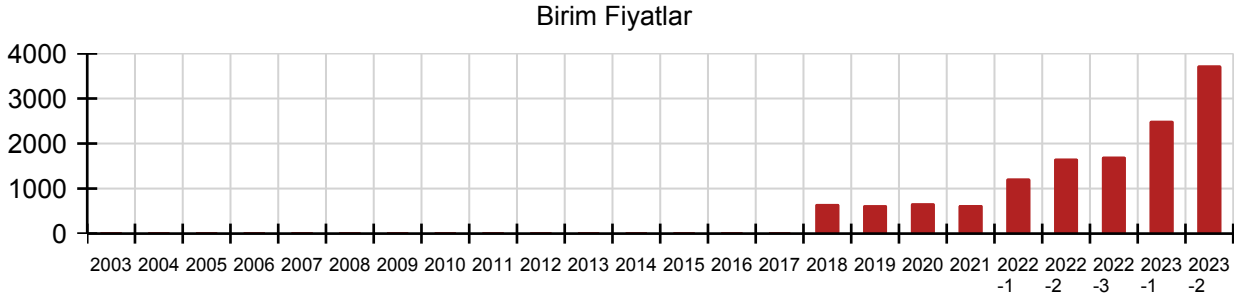

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1503	08.158803	Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
