

22.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.6-001

Tanımı 7.3-17.5kV, 400 kVA RMU'lu Monoblok Betonarme Yeraltı Beton Köşkü Trafo dâhil

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	70505,00	0,00	0,00
2017	85096,00	0,00	0,00
2015	72306,00	0,00	0,00
2013	61675,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	134456,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	460335,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	99653,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1151570,56	0,00	0,00
2016	77811,00	0,00	0,00
2020	151046,54	0,00	0,00
2021	169840,35	0,00	0,00

22.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

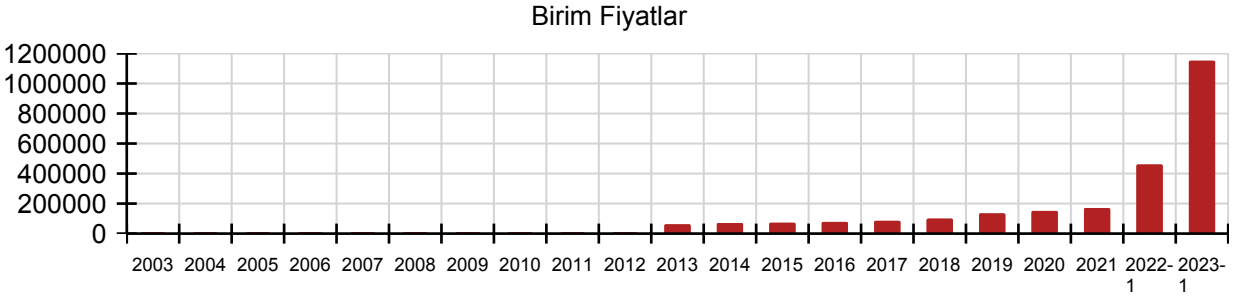

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa ve ölçülerde monoblok yapıda betonarmeden mamül köşk içerisinde;
SF6 gazlı ortamda, yük altında açma kapama yapabilen, bir giriş, bir çıkış ve bir trafo çıkışından ibaret RMU veya Modüler RMU'lar, Uygun güçte ve şartname ve standardına uygun özelliklerde trafo, Trafo gücüne uygun AG çıkış panosu bulunan ara bağlantıları ve topraklama bağlantıları yapılmış tüm malzeme ve teçhizatı ile komple. Köşkün fabrikada imal edilmesi RMU'lar veya Modüler RMU, trafo, AG panosunun montajı ve ara bağlantılarının yapılması, mamul köşkün montaj yerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, şartname ve projesine uygun ölçülerde gömülmesi için gerekli temel hafriyatın yapılması, çıkacak taş ve toprağın İdarece gösterilen yere nakledilmesi, betonarme temelin yapılması, mevcut kabloların cihazlara bağlantılarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı, köşkün etrafının uygun şekilde sıkıştırılarak doldurulması, koruma topraklamasının yapılması açılan sahanın eski haline getirilmesi malzeme bedeline dahildir, (beton köşk temeli kazılırken sökülmesi gereken arnavut kaldırımı (parke) şose, beton ve asfalt sökme ve yeniden yapma bedelleri Poz 33.1 ve Poz 33.2'den ayrıca ödenecektir.) ve sahanın eski haline getirilmesi malzeme bedeline dahildir. Modüler RMU fiderine ilave modüler RMU fideri konulduğunda malzeme ve montaj bedeli ayrıca ödenir.
- b) Montaj: Montaj için gerekli işlemler malzeme bedeli içinde verildiğinden ayrıca montaj bedeli verilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
