

## 74.026.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Poz No  | 74.026.0032                               |
| Tanımı  | C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                            |
| Kurum   | Altyapı Yatırımları (DLH)                 |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6074,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3503,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2545,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1948,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1317,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 979,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 715,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 424,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 351,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.026.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

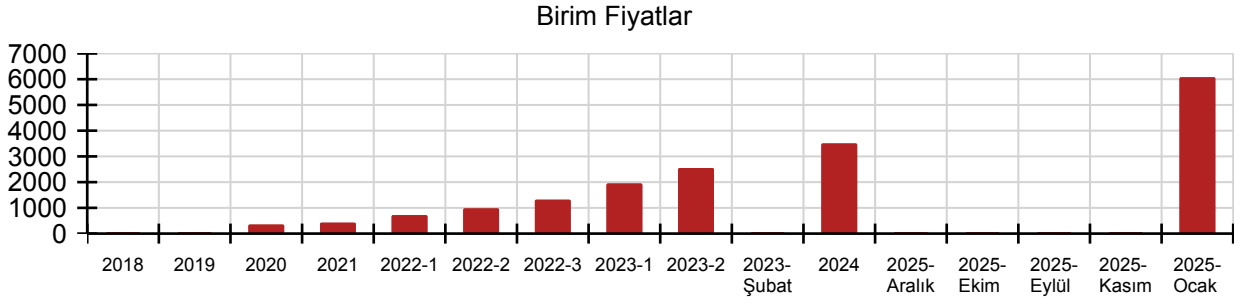

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.026.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                           | Birimi         | Miktar    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 74.002.0010 |                 | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M <sup>3</sup> /SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+ | Adet           | 0,000034  |
| 10.130.1005 | 04.001/022      | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,580000  |
| 10.130.1029 | 04.005/1B(Y)    | 32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,790000  |
| 74.002.0009 |                 | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO                                                                                        | ton            | 0,325000  |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,695000  |
| 74.002.0008 |                 | EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,760000  |
| 10.160.1030 | 04.112          | Elektrik enerjisi                                                                                                | kWh            | 57,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                                                                                       | Saat           | 0,300000  |
| 10.100.1055 | 01.404          | Operatör makinist                                                                                                | Saat           | 0,600000  |
| 10.100.1057 | 01.406          | Operatör yardımcısı                                                                                              | Saat           | 0,600000  |
| 74.004.0012 |                 | VİBRATÖR                                                                                                         | Saat           | 0,200000  |
| 10.100.1015 | 01.015          | Betoncu ustası                                                                                                   | Saat           | 0,800000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                         | Saat           | 8,500000  |
| 10.300.2037 | 04.379/B07      | Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)                                                                                  | kg             | 5,850000  |
| 19.100.1101 | 03.637(Y)       | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)                                                               | Saat           | 0,010000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
